



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI ARCO

CONSOLIDAMENTO SOLAIO DECORATO

Proprietà:

**TAMANINI - LEVEGHI**

Direttore Tecnico Impresa.:

**FALCINI** arch. Nicola

REPORT FOTOGRAFICO


**CESA di Falcini Enzo**

Via S. Anna, 34 Arco (TN) - tel 0464 519957

Zona ind.le Coldipozzo - Città di Castello (PG) - tel. 075 8642336



Stato di fatto prima dell'intervento  
Il consolidamento ha lo scopo di collegare  
strutturalmente l'orditura lignea del camorcanna  
con il controsoffitto in malta paglia

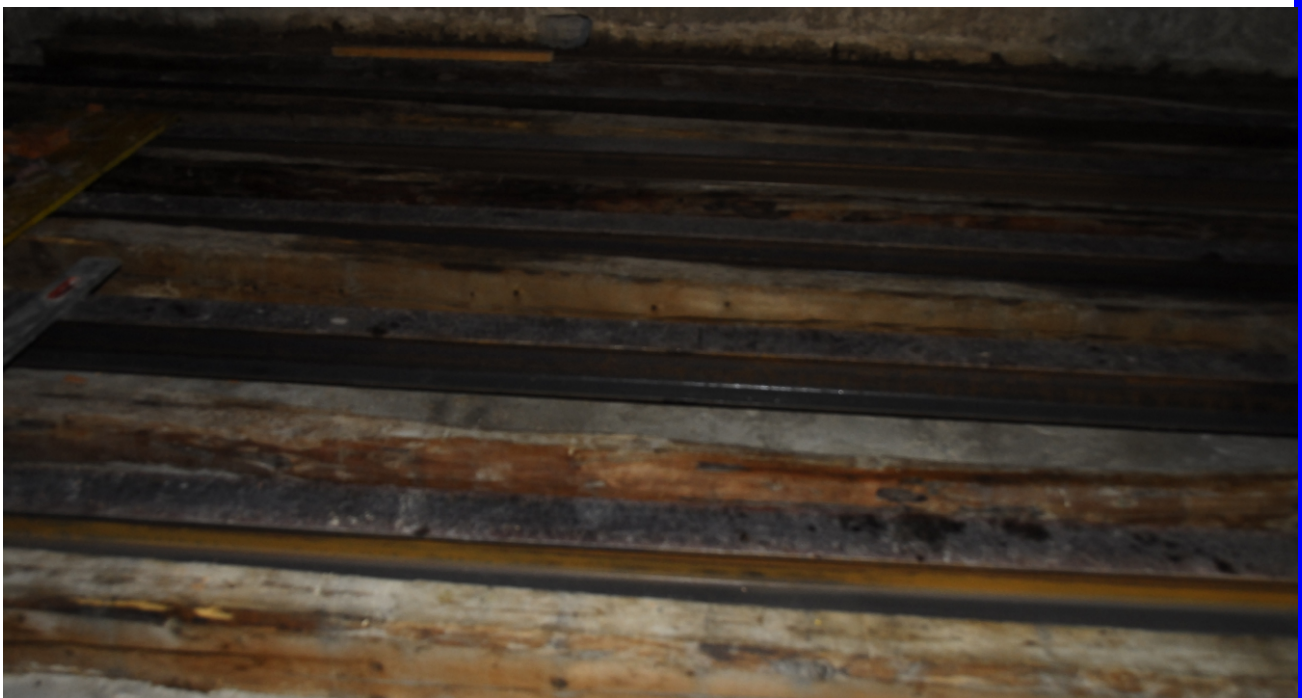





Fase intermedia del montaggio delle fibre in vetro con l'orditura opposta all'orditura lignea.


Fase finale del consolidamento montaggio della fibra monodirezionale in senso longitudinale



La lavorazione prevede le seguenti fasi:

- 1) applicazione di resina epossidica in pasta (primer) applicata a spatola
- 2) posa della fibra di vetro monodirezionale grammatura 300gr/mq
- 3) passaggio con frangibolle al fine di creare la perfetta adesione tra fibra e resina
- 4) impregnazione di fibra con resina epossidica fluida



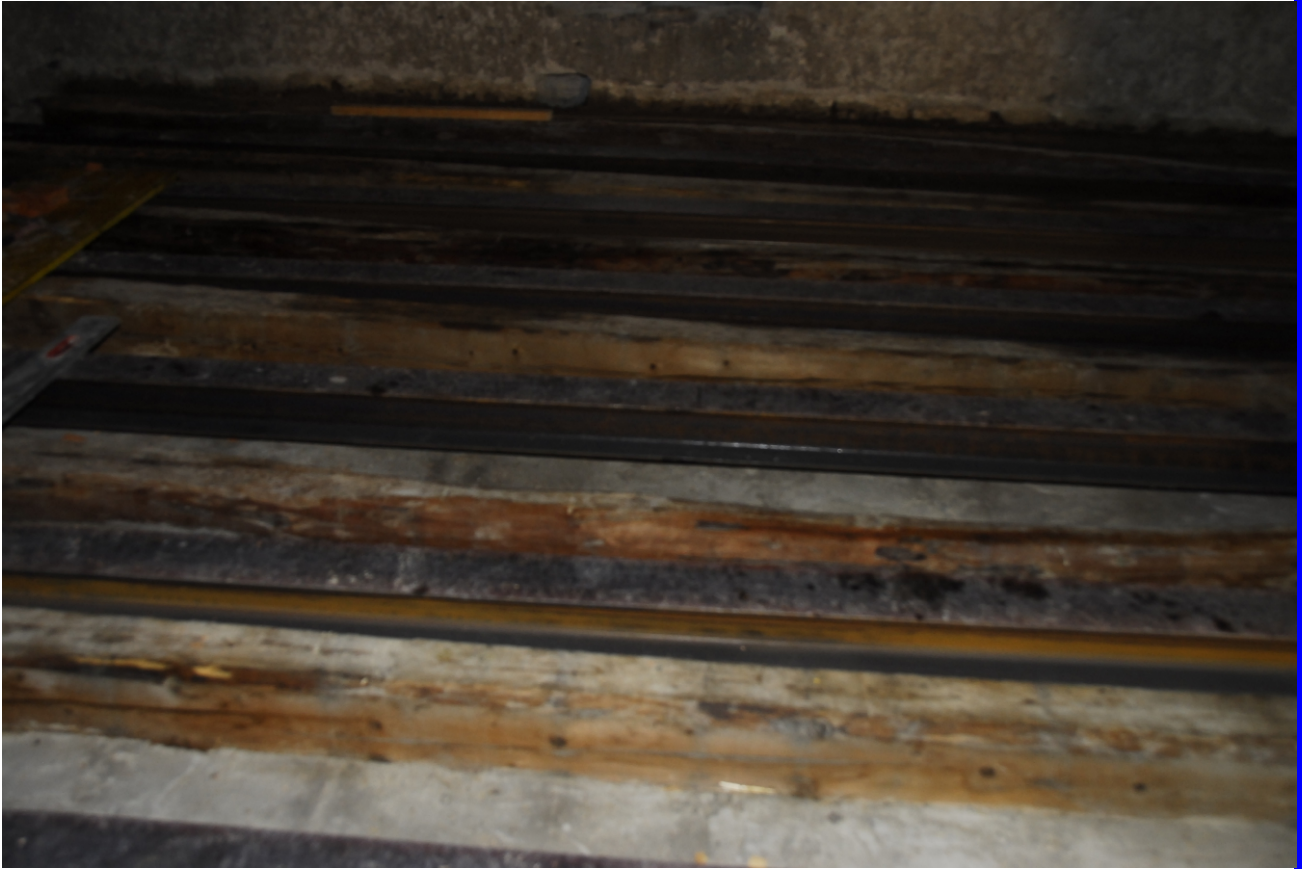

PRIMA E DOPO L'INTERVENTO

